

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 300/2022 – 09.08.2022

Da: Secretaria Executiva de Obras Públicas
Assunto: Solicitação de Pagamento do Boletim de Medição 04

À: Secretaria Secretaria Executiva de Finanças
Att: Sizenalda de Souza Timóteo

Prezado Secretária,

Pelo presente, estamos encaminhando em anexo solicitação de pagamento de Boletim de Medição nº04, conforme solicitação do Engenheiro Manoel de Almeida Castro Neto.

Nos colocamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Matrícula 22.337

Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000240

Data e Hora de Emissão

09/08/2022 11:52:18

Código de Verificação

9JPB-XZBY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



VIAENCOSTA
ENGENHARIA AMBIENTAL

CPF/CNPJ: **13.596.559/0001-78**

Inscrição Municipal: **448.416-9**

Nome/Razão Social: **VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA**

Endereço: **RUA ANTONIO LUMACK DO MONTE 128, SALA 0202 EDF EMP CENTER III - BOA VIAGEM - CEP: 51020-350**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **financeiro@viaencosta.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

CPF/CNPJ: **11.294.402/0001-62**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **PC Ministro André Cavalcante S/N - Centro - CEP: 54505-904**

Município: **Cabo de Santo Agostinho**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviço de proteção e estabilização de encosta com Geocomposto de PVC

Contrato n° 005/PMC SA-SEOB/2022

O.S. n° 04/2022

Boletim de medição n° 04

Material Aplicado R\$ 60.317,90

Locação de Equipamentos R\$ 7.416,14

Mão de Obra Aplicada - R\$ 47.795,38

Retenção de INSS - R\$ 47.795,38 mão de obra x 11% = R\$ 5.257,49

Retenção de ISS - R\$ 115.529,42 - 60.317,90 material aplicado = R\$ 55.211,52 x 5% = 2.760,58

DADOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 2811-8

C/C: 2013-3

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 5.257,49

Retenção de IRPJ
R\$ 0,00

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 115.529,42

Código da Atividade Prestada

4330401 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
60.317,90	0,00	55.211,52	5,00%	2.760,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.**

- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Cabo de Santo Agostinho - PE.

- Esta NFS-e não gera crédito.

- CEI / Código da Obra: CO001

PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTO OS SERVIÇOS PRESTADOS

**OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS DE ACORDO COM
PROCESSO LICITATÓRIO N° _____ EMPENHO N° _____
CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS E ACEITAS.**

Manoel de Almeida Castro Neto
PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
Gerente de Obras
Mat. 22.247 - CREA 16062-D/PE

Marcos José Matoso de Lima
Secretário/Executivo de Obras Públicas
PMCSA - Matrícula 22.337

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SMI
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS

SPO
150

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2022 – 08.08.2022

De: Manoel de Almeida Castro Neto – Engenheiro Civil
Assunto: Solicitação de pagamento do Boletim de Medição 04.

À: Marcos José Matoso de Lima
Secretário Executivo de Obras Públicas

Prezado Secretário,

Pelo presente reporto-me a obra de Proteção e Estabilização de Encostas com Geocomposto PVC no bairro de Pontezinha, Município do Cabo de Santo Agostinho – PE, objeto do contrato nº 005/PMCSA – SEOBP/2022, firmado entre a Prefeitura e a Viaencosta Engenharia Ambiental LTDA.

Na oportunidade solicito o pagamento no valor de **R\$ 115.529,42 (Cento e quinze mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos)**, correspondente ao Boletim de Medição nº 04, conforme planilha, memória de cálculo e relatório fotográfico em anexo, referente aos serviços realizados no período de **01/07/2022 à 31/07/2022**.

Informo que este pagamento deve ser procedido na seguinte forma:

RECURSOS	EMPENHO	VALOR (R\$)
Fonte 01	668/2022	115.529,42
Total		115.529,42

Atenciosamente,



Manoel de Almeida Castro Neto
Engenheiro Civil
CREA 16062 D/PE



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOPB

OBJETO: Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: Viarecosta Engenharia Ambiental LTDA

Tomada de preços nº 002/PNCSA-SEOPB/2021
Processo Administrativo nº 2332/2021
Processo Utilizador nº 112/PNCSA-SEOPB/2021
Contrato nº 008/PNCSA-SEOPB/2022
O.S. nº 02/2022 - Data: 28/03/2022
Valor: R\$ 1.888.386,98

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022	OBRA: Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC
Valor Total Do Contrato	R\$ 1.888.386,98
Valor Medido no Período	R\$ 115.529,42
Acumulado até o Período	R\$ 1.426.487,65
Saldo Atual	R\$ 471.872,43

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREVISTO NO CONTRATO	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	FINANCEIRO					
					MEDIDO NO PERÍODO	EM Nº 04	REALIZADO ATÉ O PERÍODO		PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	REALIZADO ATÉ O PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO	% ACUMULADO	
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA												
1.1	Composição	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO DE CANTIERO	MES	4,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 34.801,00	7.418,14	34.801,00	0,00	100,00%		
1.2	Composição	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	4,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 2.314,15	9.266,60	2.314,15	0,00	100,00%		
1.3	Composição	ALUGUEL DE VEÍCULO - Com Combustível	MES	4,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 979,68	3.918,72	979,68	0,00	100,00%		
1.4	Composição	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	M2	4,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 4.122,31	16.489,24	4.122,31	0,00	100,00%		
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		12,00				R\$ 411,37	4.936,44	0,00	0,00	100,00%		
2.1	Composição	Administração Local	MES	4,00	1,00	1,00	4,00	R\$ 31.674,39	126.697,56	31.674,39	0,00	100,00%		
3.0		SERVIÇOS PRELIMINARES												
3.1	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A= 12/2017 - Resíduo de obras que caírem	M3	2,00			2,00	R\$ 56,27	110,54	0,00	110,54	0,00	100,00%	
3.2	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A= 12/2017 - Resíduo de construções não mais existentes	M3	1,00			1,00	R\$ 600,16	600,16	0,00	600,16	0,00	100,00%	
3.3	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENVAZADA. A= 05/2016 - Capinaço e remoção	M2	8.612,00			7.166,40	R\$ 3,34	28.764,08	0,00	23.936,78	4.828,30	89,21%	
4.0		MOVIMENTOS DE TERRA												
4.1	Composição	RETALHANDIMENTO MANUAL DE TERRENO ATÉ 0,20CM (0,612,0 X 0,20 X 1,3) EMPOLAMENTO	M3	2.239,12			2.016,16	R\$ 16,27	34.191,36	0,00	30.771,34	3.420,02	80,00%	
4.2	Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA GRANEL, JERICA 90L, 30M - 20% DO VOLUME	M3	447,82			403,04	R\$ 26,46	11.387,02	0,00	10.267,37	1.138,66	80,00%	
4.3	Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA GRANEL, JERICA 90L, 50M - 60% DO VOLUME	M3	1.343,47			1.206,12	R\$ 31,62	42.749,22	0,00	36.474,20	4.275,02	80,00%	
4.4	Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA GRANEL, JERICA 90L, 100M - 20% DO VOLUME	M3	447,82			403,04	R\$ 42,42	18.896,62	0,00	17.096,86	1.899,66	90,00%	
4.5	Composição	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA 8 M²	UND	120,00			96,00	R\$ 453,10	64.372,00	0,00	43.044,60	11.327,60	79,17%	
6.0		DRENAÇÃO												
6.1	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	180,00			6,00	R\$ 62,36	11.228,40	0,00	374,28	10.854,12	3,33%	
6.2	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO	M	36,00			36,00	R\$ 74,66	2.687,76	0,00	2.687,76	0,00	100,00%	
5.3	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 6X19X9CM (ESPESURA IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	620,00			0,00	R\$ 52,73	32.692,60	0,00	0,00	32.692,60	0,00%	
5.4	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE	M2	1.240,00			0,00	R\$ 7,31	9.064,40	0,00	0,00	9.064,40	0,00%	

Fernando Andrad

FERNANDO ANDRADE ISMAGO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREA/PE nº 056113-0/Nº- 181352131

THAIS FERNANDA AGUIAR DE MEDINA
COORDENADORA OBRAS
PMCSA MAT. 022268

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 166520/PE
MAT. 22347 PMCSA



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PUBLICAS - SEOBP
OBJETO: Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC
MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
CONTRATADA: Viarecosta Engenharia Ambiental LTDA

Tomada de preço nº 002/PMCSA-SEOBP/2021
Processo Administrativo nº 232/2021
Processo Licitatório nº 113/PMCSA-SEOBP/2021
Contrato nº 006/PMCSA-SEOBP/2022
O.S. nº 022022 - Data: 28/02/2022
Valor: R\$ 1.888.359,98

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04			
PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022			
OBRAS: Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC	Valor Total Do Contrato	R\$ 1.888.359,98	
Valor Medido no Período	R\$ 115.529,42		
Acumulado até o Período	R\$ 1.428.487,55		
Saldo Atual	R\$ 471.872,43		

ITEM / CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE			PREÇO UNITÁRIO COM IPI	FINANCEIRO			% ACUMULADO	
			PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO	SI M 04		REALIZADO ATÉ O PERÍODO	PREVISTO NO CONTRATO	MEDIDO NO PERÍODO		REALIZADO ATÉ O PERÍODO
5.5	SINAPI 87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA M2 DA MANUSEIO EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2014	M2	1.240,00	0,00		64,34	79.751,60	0,00	79.751,60	0,00%	
5.6	SINAPI 94975 CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3:4,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 - Fundo de emalhas	M3	8,00	0,00		489,52	3.756,16	0,00	3.756,16	0,00%	
5.7	Composição 10 CAIXA DE PASSAGEM NAS DIMENSÕES 80CMX80 CMX80CM, COM PISO EM CONCRETO, E PAREDES REVESTIDAS	UND	3,00	0,00		633,98	1.901,94	0,00	1.901,94	0,00%	
6.0	REVESTIMENTO DE TALUDE/GEOCOMPOSTO										
6.1	Composição 11 FORNECIMENTO GEOCOMPOSTO DE PVC DE 1,70MM DE ESPESURA, COM TRANSPASSO MÍNIMO DE 4CM, INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA APLICAÇÃO QUE ATENDA AS NORMAS NBR 12899 E NBR 12824 E A ASTM D 7924/833 E D 7924/833	M2	8.612,00	8.611,88		89,92	774.391,04	0,00	774.391,04	100,00%	
6.2	Composição 12 APLICAÇÃO DO GEOCOMPOSTO DE PVC, INCLUSIVE COLAGEM DAS MANTAS	M2	8.612,00	5.714,75		23,54	202.726,48	0,00	134.528,22	68,98%	
6.3	Composição 13 CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA MÉDIA OU GROSSA, LAVADA, TRAÇO 1:3 ADITIVADO, ESPESURA MÍNIMA 6MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M2	8.612,00	2.277,00	2.277,00	33,57	289.104,94	76.438,89	176.031,01	60,89%	
6.4	Composição 14 PINTURA PROJETADA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO UMA DEMÃO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA MOTORIZADA	M2	8.612,00	0,00		11,82	101.793,94	0,00	101.793,94	0,00%	
6.5	SINAPI 94975 CONCRETO FCK = 18MPA, TRAÇO 1:3:4,3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	16,00	16,00		466,52	7.042,80	0,00	7.042,80	100,00%	
6.6	SINAPI 87304 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNICA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019-Par tes dos iniciais	M3	16,00	10,00		666,68	6.666,80	0,00	6.666,80	100,00%	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						23.881,84	0,00	23.881,84	0,00%	
7.1	Composição 15 CERCA COM NOZINJOS DE CONCRETO REVESTIDO COM TUBOS DE 100MM, ESPACAMENTO DE 1,5M, ALTURA LIVRE DE 1,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME	M	210,00	0,00		68,70	14.437,00	0,00	14.437,00	0,00%	
7.2	Composição 16 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	8.612,00	0,00		1,07	9.214,84	0,00	9.214,84	0,00%	
							1.888.359,98	115.529,42	1.428.487,55	471.872,43	75,14%

Fernando Andrade
FERNANDO ANDRADE IGNAÇIO DA SILVA
ENG. CIVIL
CREAPE Nº 056111-D/RNP - 1813521131

THAYS FERNANDA QUEIROZ DE MEDINA
COORDENADORA OBRAS
PMCSA MAT. 022268

MANCEL DE ALMEIDA CASTRO NETO
ENG. CIVIL
CREA 180620/PE
MAT. 22247 PMCSA

CREA-PE nº 056111-D/RNP: 1813521131

ENG. CIVIL

FERNANDO ANDRADE IGNAÇÃO DA SILVA

Fernando Andrade Ignação da Silva

THAYS FERNANDA QUEIROZ DE MEDINA

COORDENADOR OBRAS

PMCSA MAT: 022268

Thays Fernanda Queiroz de Medina

MANOEL DE ALMEIDA CASTRO NETO

ENG. CIVIL

CREA 16062D/PE

MAT: 22247 PMCSA

Manoel de Almeida Castro Neto

Item	Código	Descrição	Unid	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant	TOTAL
1.0		INSTALAÇÃO DA OBRA							
1.1		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO DE CANTINEIRO	MES	1,00					1,00
		Total medio no periodo							1,00
1.2		ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	MES	1,00					1,00
		Total medio no periodo							1,00
1.3		ALUGUEL DE VEÍCULO - Com Combustível	MES	1,00					1,00
		Total medio no periodo							1,00
2.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
2.1		ADM LOCAL		1,00			1,00		1,00
		Total medio no periodo							1,00
6.0		REVESTIMENTO DE TALUDE/RECOMPOSTO							
6.3		CHAPISCO PROJETADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREA MEDIA OU GROSSA, LAVADA, TRACO 1:3, ADMIVADO, ESPESSURA MINIMA 5MM (PROTEÇÃO MECÂNICA)	M2						2277,00
		Aplicação de chapisco projetado (Rua santo antonio) - Entre as casas nº 33 e 51 e complemento Santa Rosa entre as casas 57 e 67.	m²		99,00			23,00	2277,00
		Total							2277,00

PERÍODO: 01/07/2022 A 31/07/2022




PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS PÚBLICAS - SEOBP
 OBJETO: Proteção de encosta com Geocomposto de PVC
 MUNICÍPIO: CABO DE SANTO AGOSTINHO
 CONTRATADA: Viacosta Engenharia Ambiental LTDA





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – BOLETIM DE MEDIÇÃO 04

Obra:	Proteção e Estabilização de Encosta com Geocomposto de PVC.
Local:	Pontezinha – Cabo de Santo Agostinho.
Período:	01/07/2022 à 31/07/2022
Contratada:	Vaencosta Engenharia Ambiental LTDA.

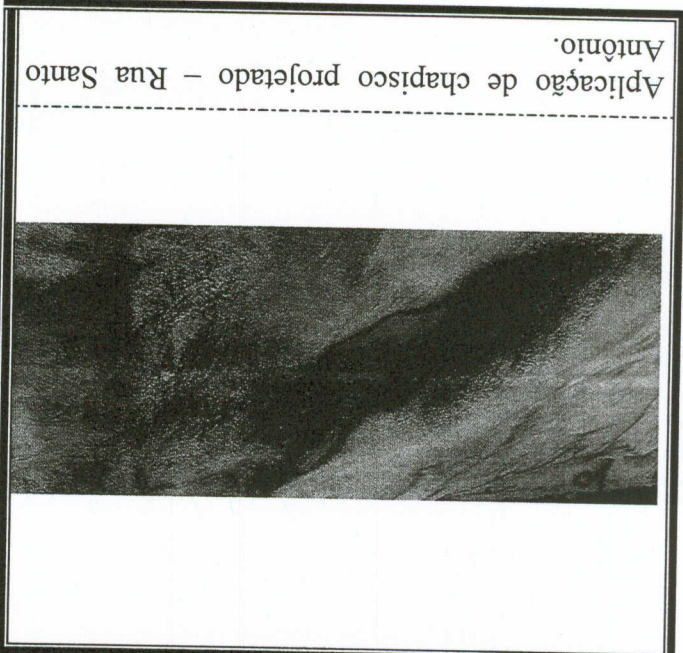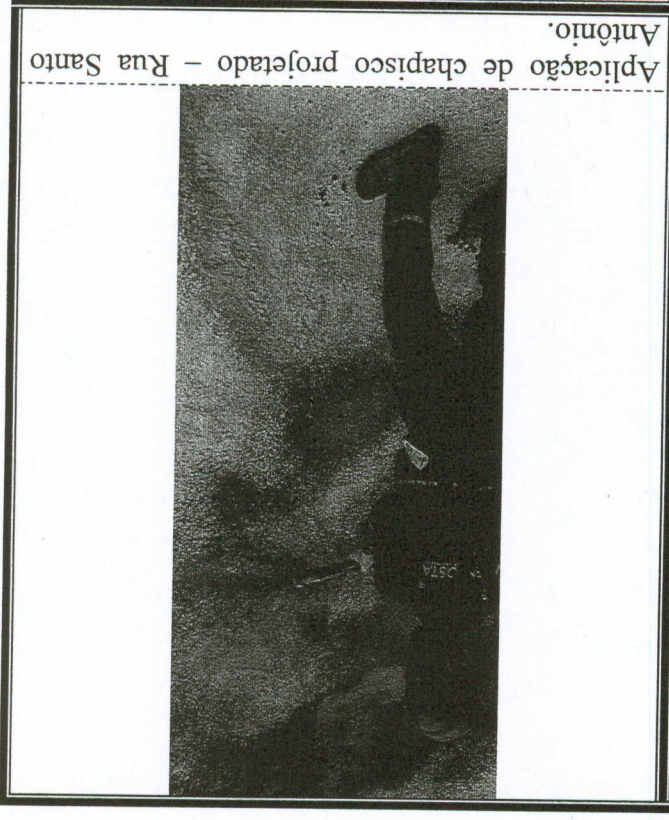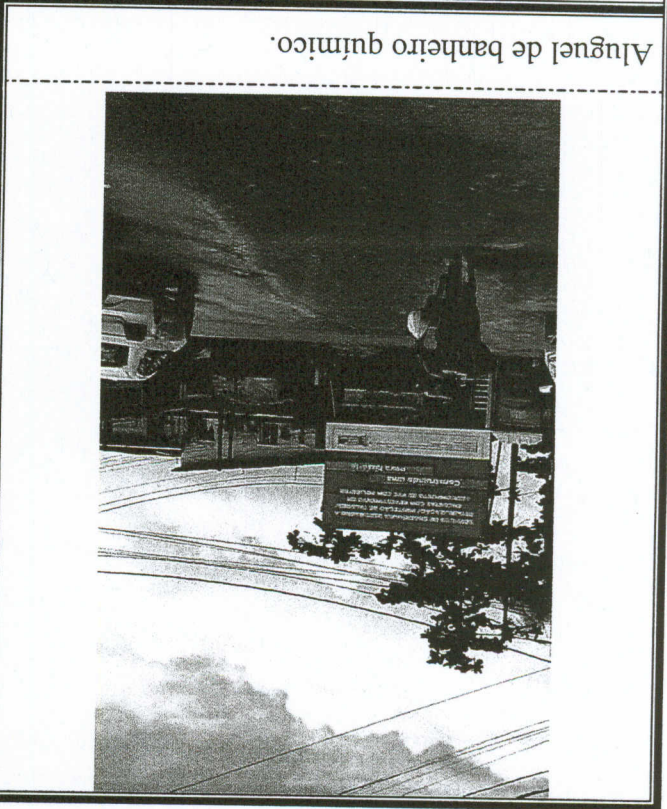

Manoel de Almeida Castro Neto
 PMCSA - Sec. Executiva de Obras Públicas
 Gerente de Obras
 Mat. 22.247 - CREA 18062-DPE

Thays Fernanda Queiroz de Medina
 PMCSA - Sec. Municipal de Infraestrutura
 Coordenadora de Obras
 Mat. 22.268
